




**Contrat Territorial Milieu Aquatique  
du Syndicat du Dué et du Naraïs**

**Comité Pilotage du 25 Janvier 2017**

# Travaux d'entretien de la végétation des berges et plantation, gestion des encombres

## carte de programmation prévisionnelle

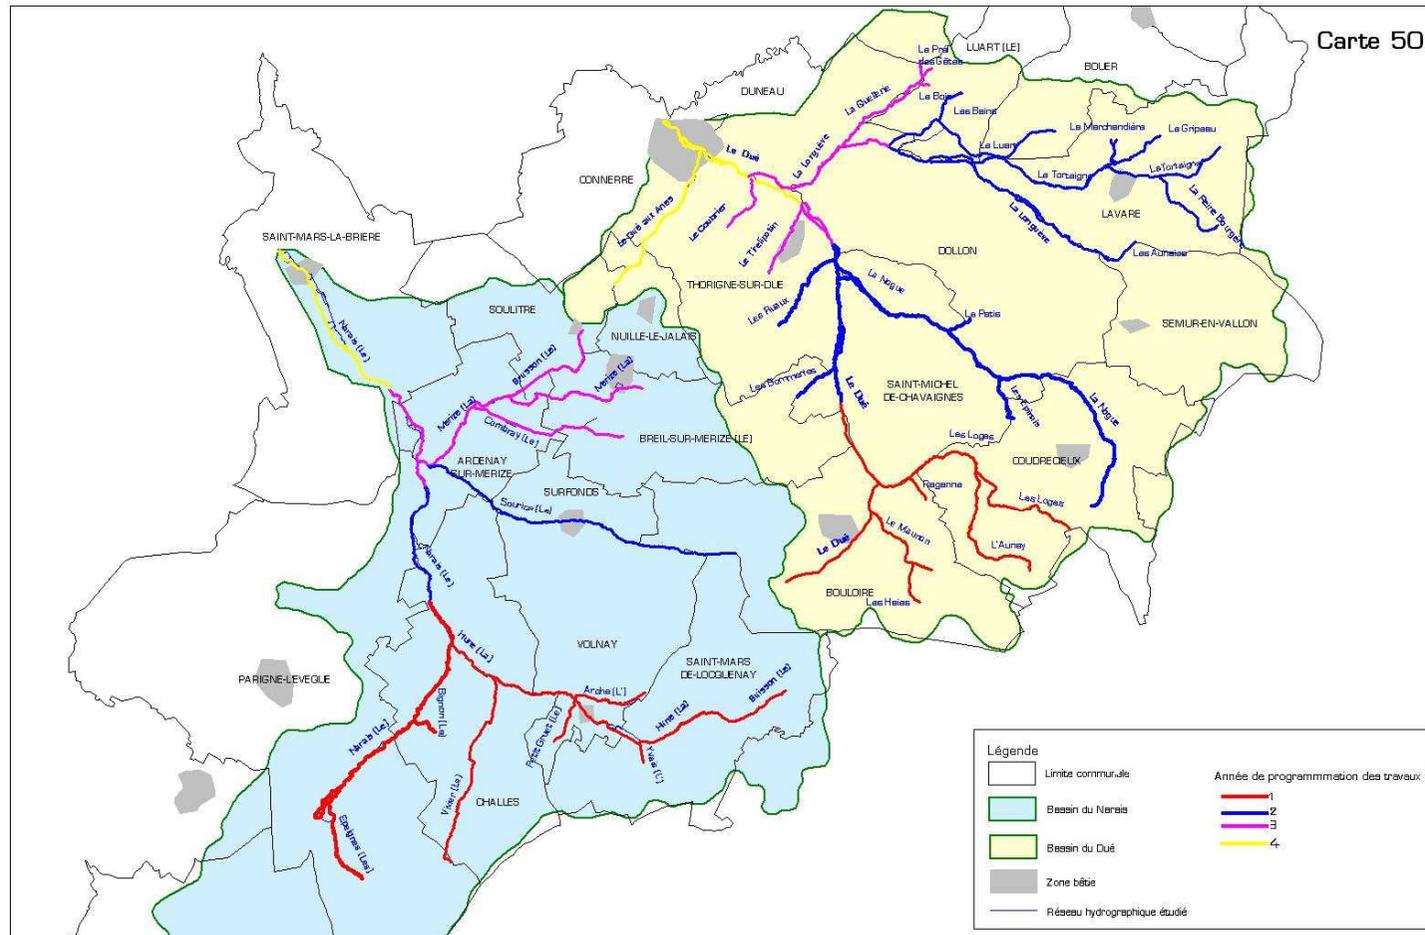


scan 25 © IGN - Paris 2004



Bassins du Dué et du Narais : programmation des travaux

# Travaux d'entretien de la végétation des berges et de plantation, gestion des encombres

Prévisionnel hiver 2015-2016

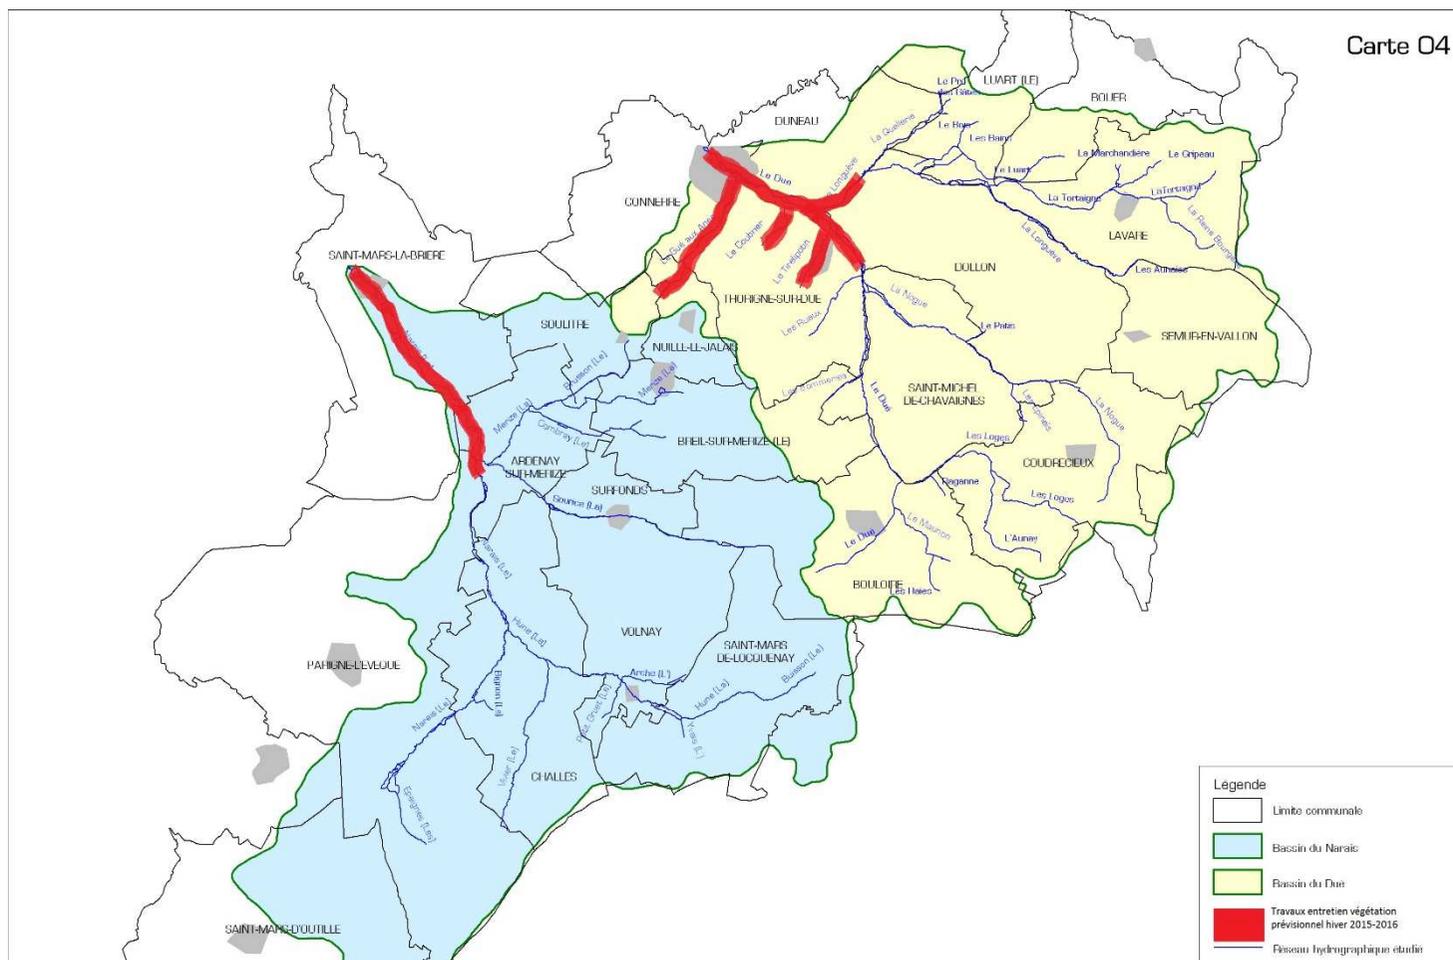

scn 25 © IGN - Paris 2004

OCRE par HYDRO CONCEPT




Bassins du Dué et du Narais : réseau hydrographique

HYDRO CONCEPT 2006  
04\_Duè\_HesauHydro

# Travaux d'entretien de la végétation des berges et de plantation, gestion des encombres

Réalisé hiver 2015-2016

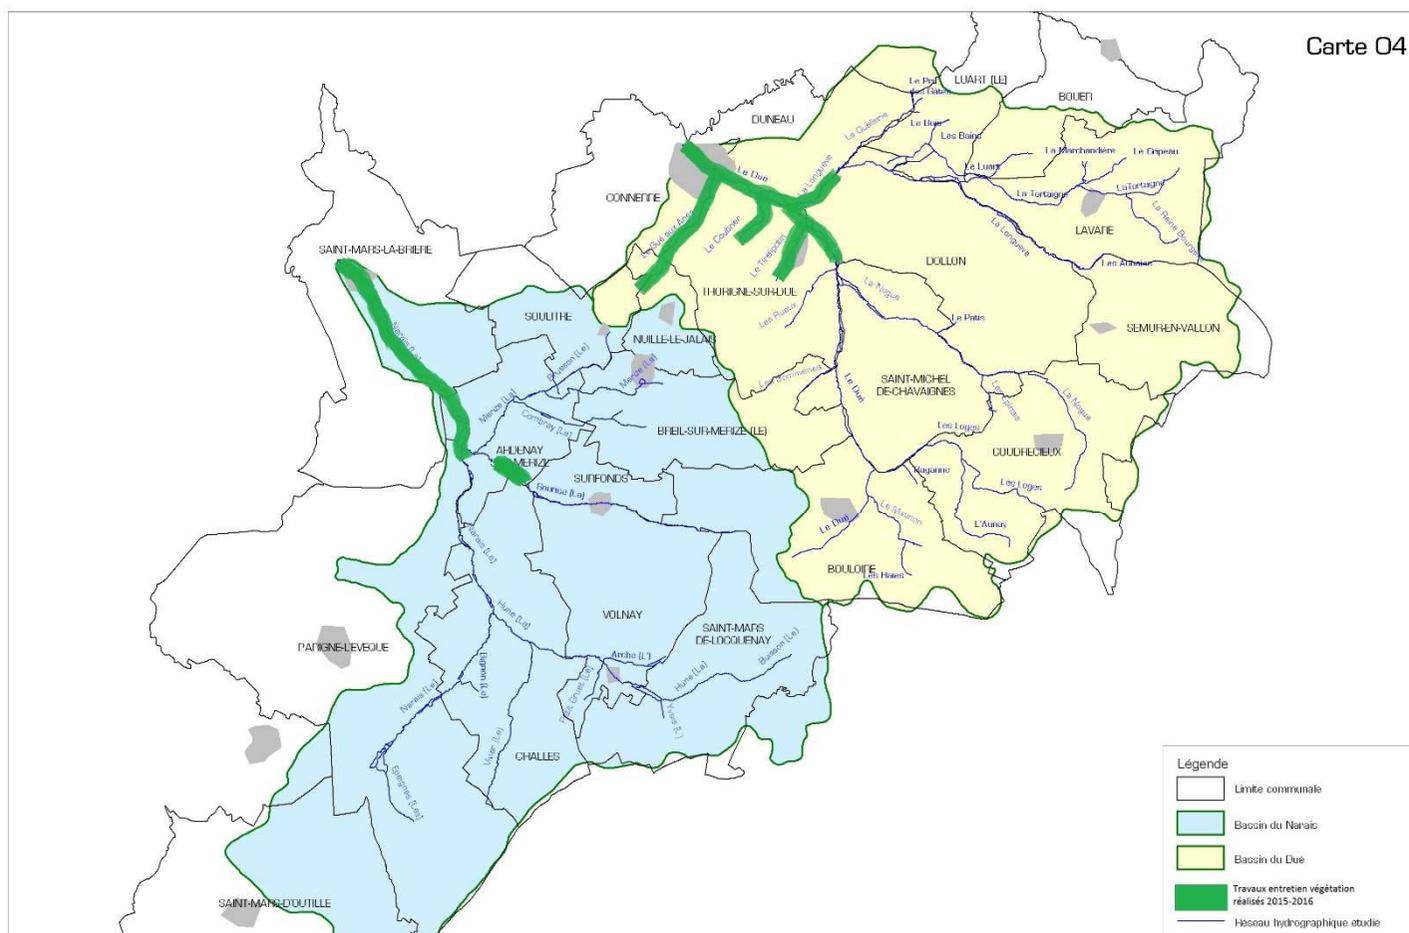

Bassins du Dué et du Narais : réseau hydrographique

# Travaux d'entretien de la végétation des berges et de plantation, gestion des encombres

Hiver 2015-2016  
Bilan financier

## Lot Narais

N° de Bon de Commande	Montant TTC
22	12 344,45
23	3 305,40
24	891,18
25	881,14
26	13 297,45
27	1 562,80
28	1 260,25
29	308,03
30	49,82
31	93,24
32	548,69
Total	34 542,45

## Lot Dué

N° de Bon de Commande	Montant TTC
28	9 368,72
29	6 313,61
30	8 322,83
31	11 059,91
32	3 992,64
33	13 202,23
34	174,40
35	58,32
36	774,26
37	19,44
Total	53 286,36

Coût total : 87 828,81 € TTC pour 41,684 Km soit 2,11 €/ml de CO

# Travaux d'entretien de la végétation des berges et de plantation, gestion des encombres

- Rappel concernant les campagnes précédentes :
  - 2013-2014 : 2,82 €/ml de cours d'eau
  - 2014-2015 : 1,17 €/ ml de cours d'eau
- Soit pour l'ensemble du CTMA : **2,03 € ml** de cours d'eau




# Travaux de renaturation et de franchissement des cours d'eau

## RAPPEL Planning prévisionnel Novembre 2013


- 28 novembre 2013 : Comité Syndical : Présentation du diagnostic, choix des sites d'intervention et définition des enveloppes budgétaires.
- Hiver 2013-2014 : rédaction des PRO
- Printemps 2014 : Consultations des entreprises
- Été 2014 : première tranche de travaux
- Été 2015 : deuxième tranche de travaux




# Travaux de renaturation et de franchissement des cours d'eau lot n°1 bassin du Dué état avancement lors du dernier COPIL (décembre 2015)

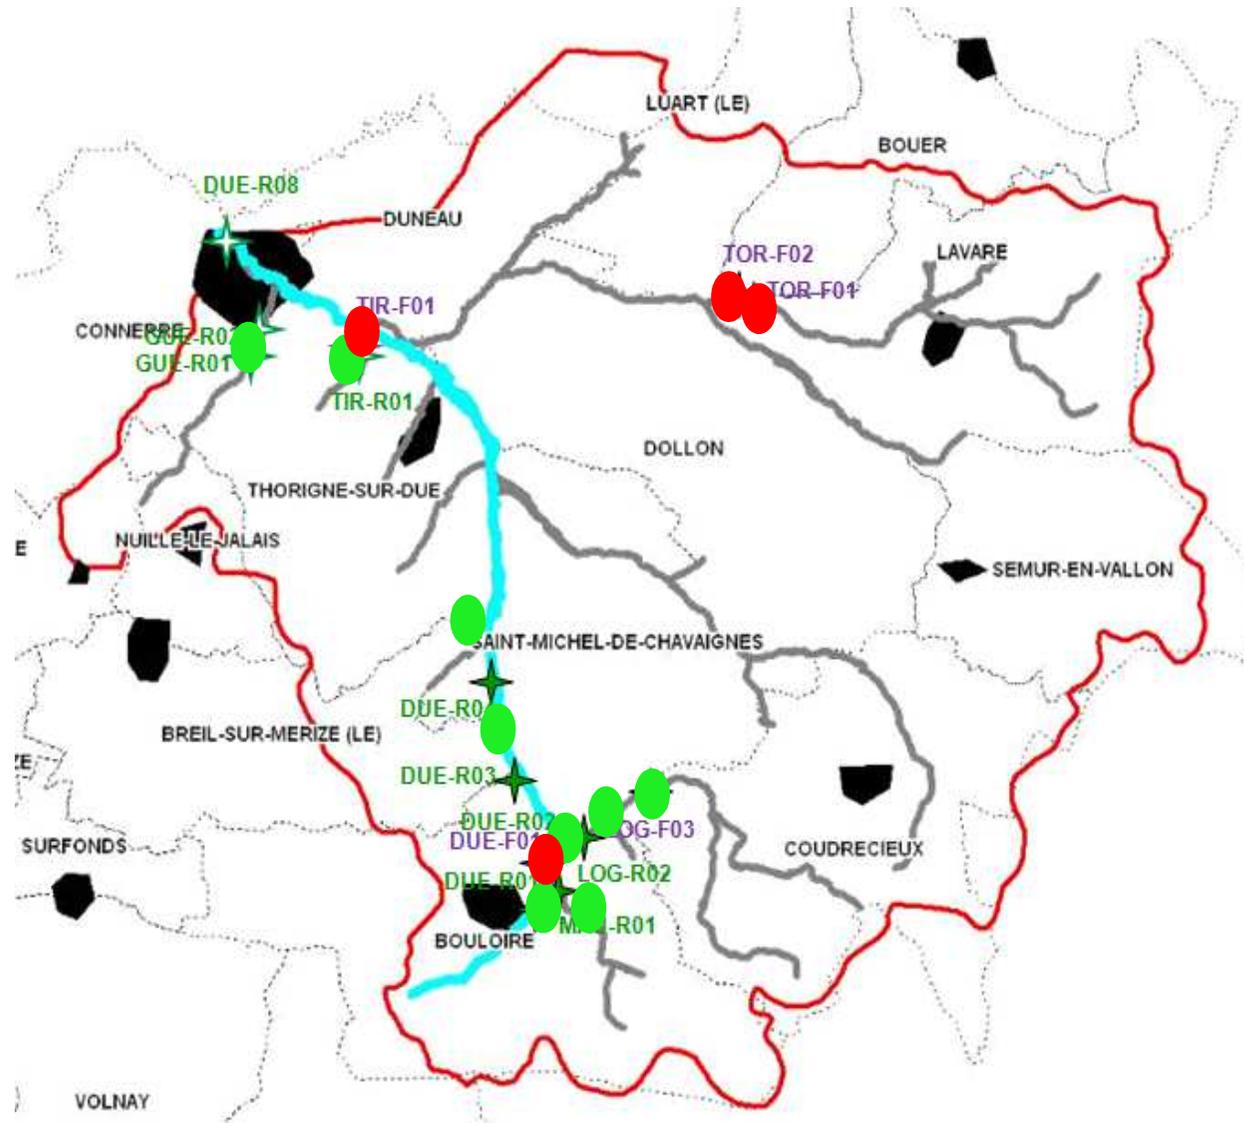

# Travaux de renaturation et de franchissement des cours d'eau lot n°1 bassin du Dué état avancement aujourd'hui

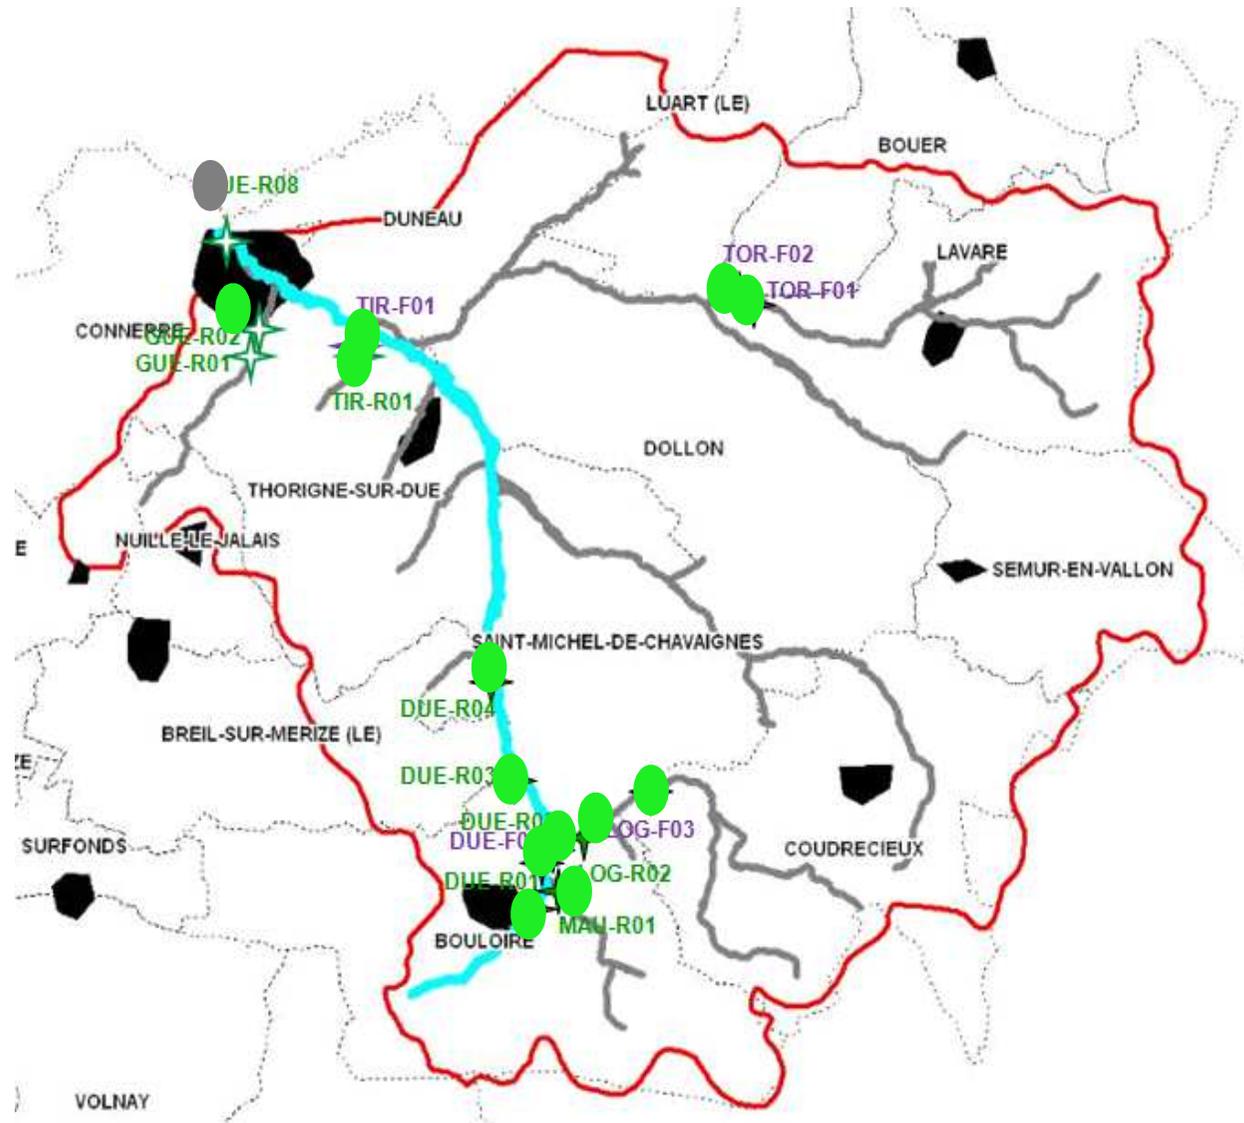

# Travaux de renaturation et de franchissement des cours d'eau lot n°2 bassin du Narais Prévisionnel

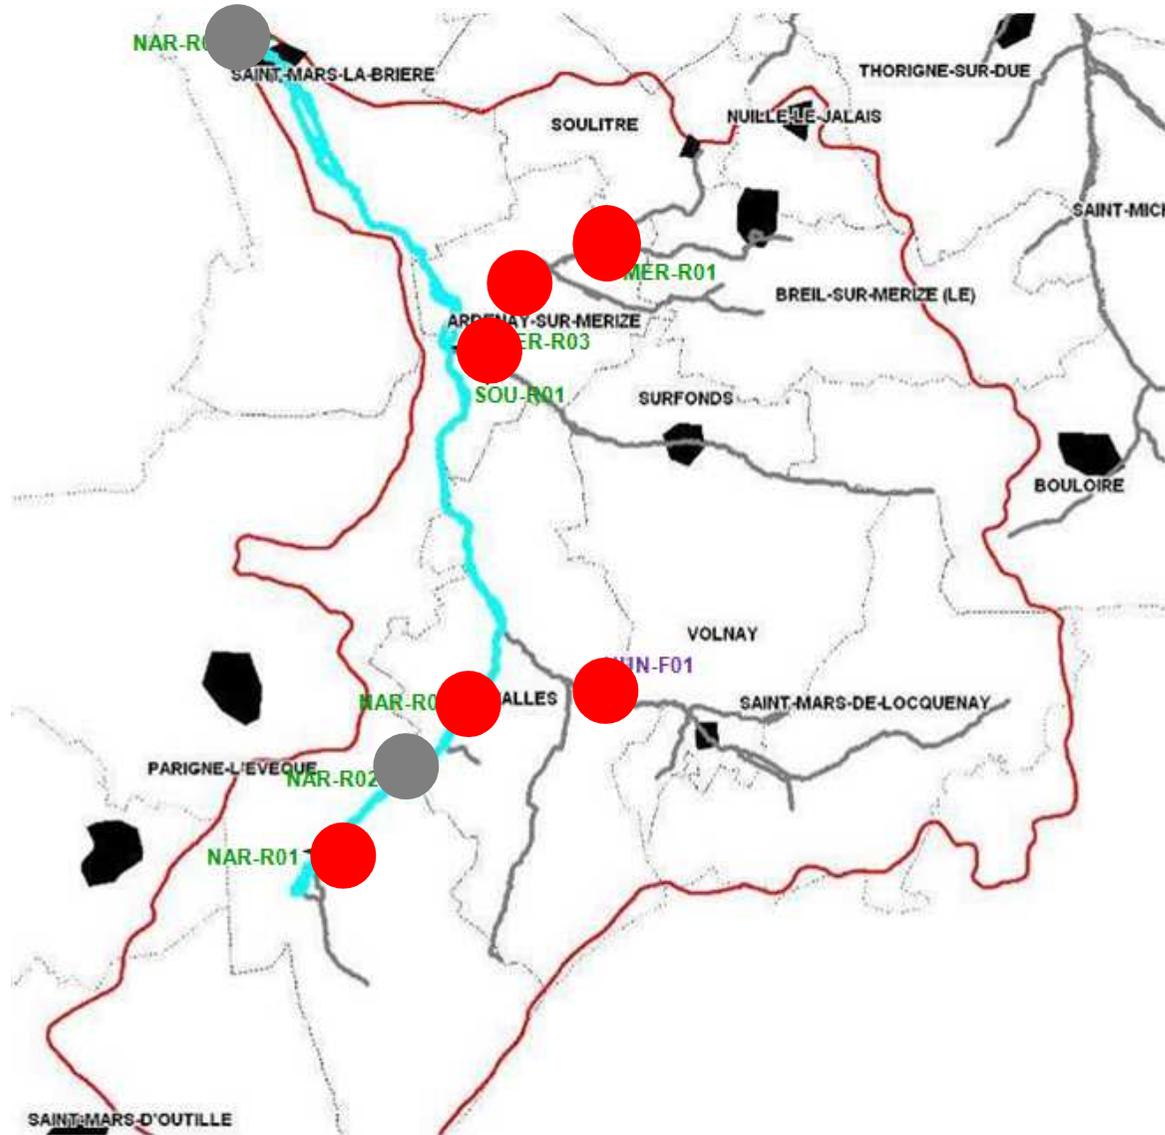

# Travaux de renaturation et de franchissement des cours d'eau lot n°2 bassin du Narais


**Prévisionnel : 7 sites, 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle.**

La tranche conditionnelle n°7 n'a pas été affranchie par le comité syndical car peu d'intérêt de renaturer sans régler au préalable les enjeux de continuité écologique sur le site du Moulin Biard

De nombreuses modifications au moment de la phase préparatoire :

- 1 tranche ferme : 7 sites étaient prévus mais deux ont été annulés sur le cours d'eau de la Merize. Après concertation avec les partenaires techniques du CTMA, il est apparu que l'un des sites n'avait pas été mis à l'enquête publique et sur le deuxième les travaux prévus n'auraient que peu d'effet sur la restauration hydromorphologique du cours d'eau. Les enveloppes financières ont été reportées sur les sites NAR R01 et R03 où des travaux d'accompagnement n'avaient pas été pris en compte lors de la conception du projet : pose de clôture, aménagement d'abreuvoir (**3 unités**), broyage de végétaux.
- Tc 7 : Non affermi

# Travaux de renaturation et de franchissement des cours d'eau lot n°2 bassin du Narais réalisé 2016

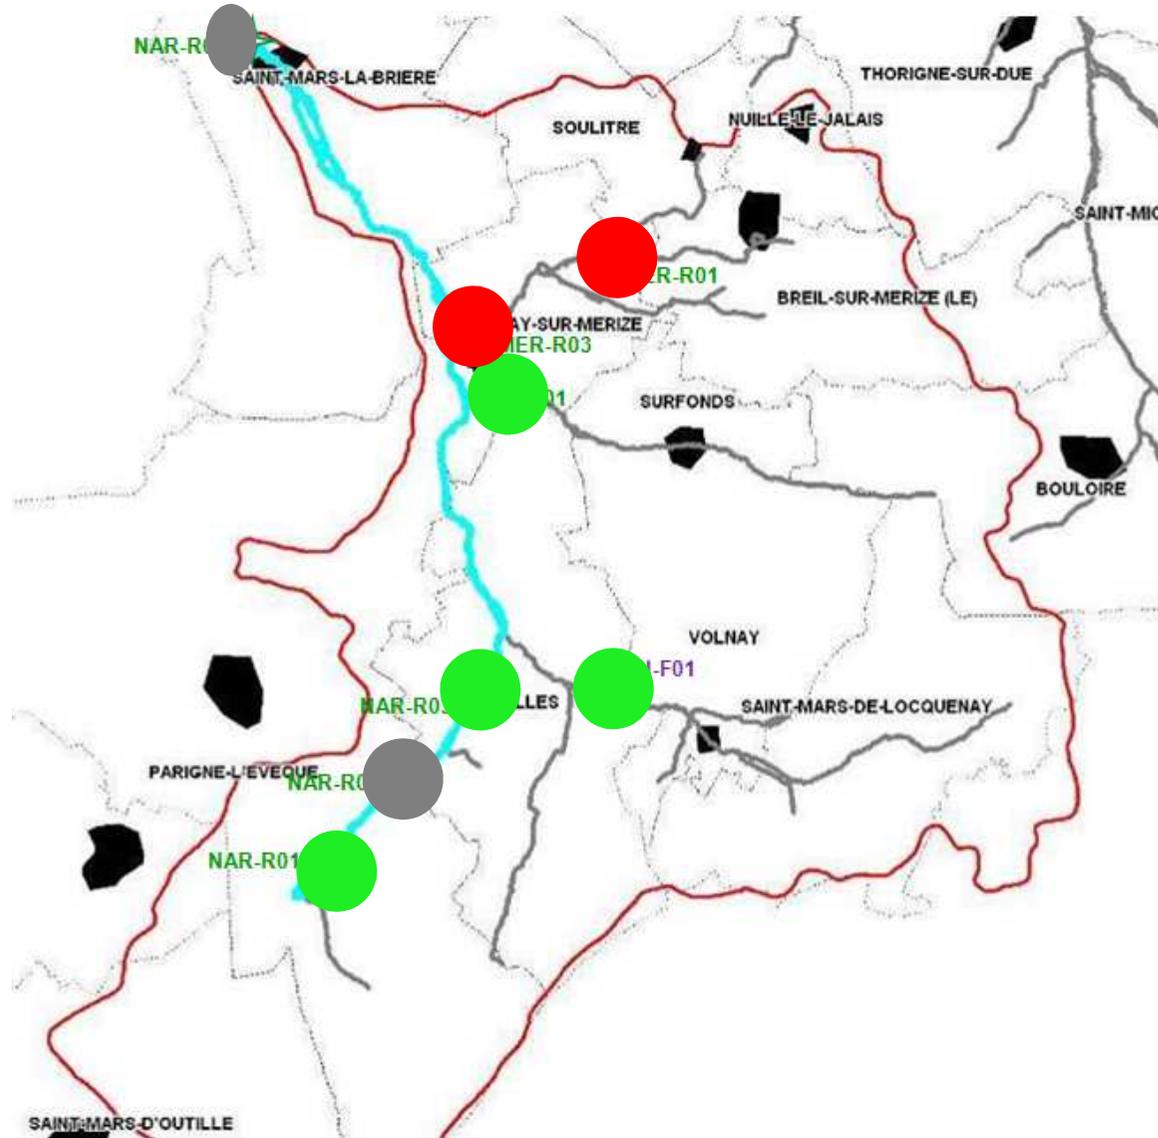

## Les études débutées en 2016

- COPIL de démarrage de l'étude continuité des ouvrages sur le bassin du Narais, ajout de 3 ouvrages et rencontre de l'ensemble des propriétaires concernés (22 entretiens individuels).
- COPIL de démarrage de l'étude Bilan et perspective du Contrat Territorial Milieu Aquatique et exécution des phases de terrain.



## Ouvrages concernés par l'étude continuité écologique bassin du Narais

Cours d'eau	Commune	Systèmes hydrauliques complexes pouvant contenir chacun plusieurs ouvrages
Narais	Saint Mars la Brière	Moulin de Biard
Narais	Saint Mars la Brière	Ancienne usine de la Pierre Humide
Narais	Saint Mars la Brière	Moulin du Château de Saint Mars la Brière
Narais	Ardenay sur Merize	Moulin de Soteau
Narais	Ardenay sur Merize	Moulin Neuf
Narais	Parigné l'Evêque	Moulin de Cogé
Narais	Parigné l'Evêque	Ancien moulin des Foulerets
Narais	Challes	Moulin Bégault
Narais	Challes	Moulin Champion
Narais	Challes	Moulin de Challes
Narais	Parigné l'Evêque	Moulin de l'Aunay
Narais	Parigné l'Evêque	Moulin de la bruyère
<b>Fretays</b>	<b>Parigné l'Evêque</b>	<b>Plan d'eau de la Cèverie</b>
Merize	Ardenay sur Merize	Système hydraulique de la Rainière
Merize	Ardenay sur Merize	Seuil du Bois d'Ardenay
<b>Combray</b>	<b>Le Breil sur Merize</b>	<b>Plan d'eau amont du Bois de Pin de Sucre</b>
<b>Combray</b>	<b>Le Breil sur Merize</b>	<b>Plan d'eau aval du Bois de pin de Sucre</b>
Combray	Ardenay sur Merize	Ensemble des ouvrages de la propriété du Château d'Ardenay
Sourice	Ardenay sur Merize	Chaussée la Caluyère
Sourice	Volnay	Moulin du Frêne
Hune	Volnay	Ancienne pêcherie
Hune	Volnay	Moulin Follet

**Merci de votre attention**

